

## INFORME DE AVANCE DE OBRA


### MARZO 2025

#### Torre 7

Se realizó el hormigonado la losa en tercer piso SECTOR C y 4to piso SECTOR A. El mismo se realizó con hormigón elaborado H21 de la empresa TOSCA SUR.

Por otro lado, se avanza con el armado de encofrados en losas en 3er piso SECTOR B, 4to piso sector C y terraza SECTOR A.

Como próxima tarea en abril se planifica hormigonar losa 3er piso SECTOR B de 88m<sup>3</sup> durante una larga jornada de trabajo.

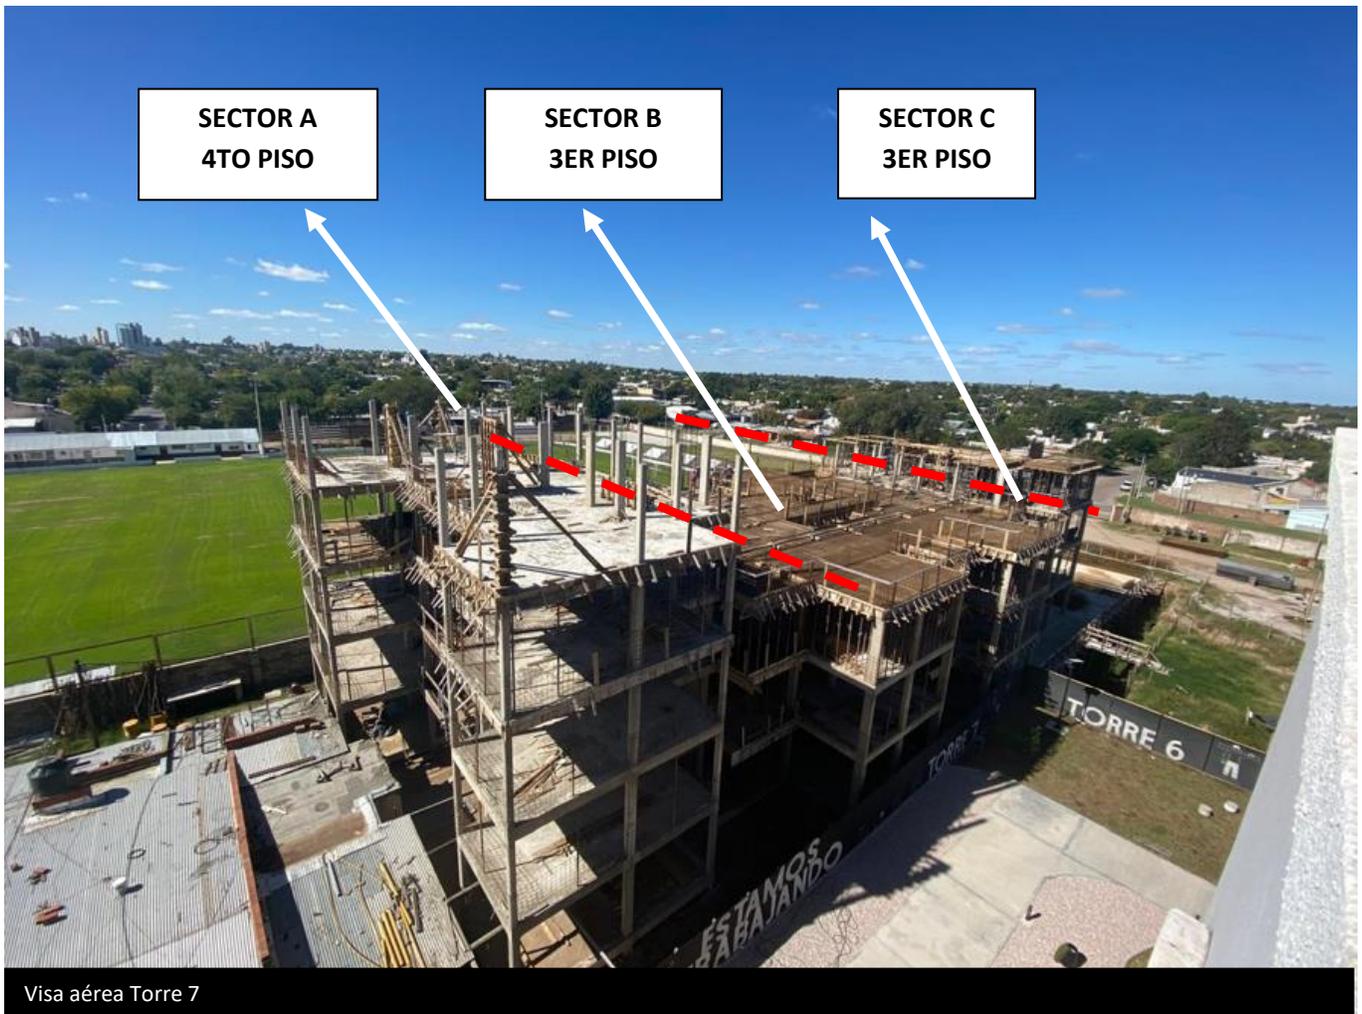




Además, queríamos informar que diariamente se realiza limpieza de obra para evitar que queden elementos peligrosos que pueden producir accidentes. Por otro lado, se realizan limpiezas periódicas en baños, comedor, obradores y palita mini cargadora.



El equipo de trabajo de obra cuenta con 24 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizó compra de hormigón H21 a la empresa TOSCA SUR, cabe destacar que tenemos poco material de stock, **compramos según la demanda de materiales que tengamos en obra.**

**Es un momento clave de la obra para poder avanzar con varios frentes de trabajo, es imprescindible la inversión de dinero para acopio de materiales para ganarle a la inflación y adelantar en tiempo de construcción.**




Descofrado. LOSA SECTOR A – 3ER PISO



Escalera hormigonada 2do piso.



Tareas de armado de Viga con puntos de anclajes



Vista – Armado de Columnas y Vigas. SECTOR C – 4to piso.



Vista – Armado de Columnas. SECTOR A – Terraza.
