

INFORME DE AVANCE DE OBRA

ABRIL 2025


Torre 7

Se realizó el hormigonado del 3er piso SECTOR B que consta de 88m³ de hormigón, una jornada que duró todo el día.

Por otro lado, se avanza con el armado de encofrados en losas en 4to piso sector C y terraza SECTOR A.

Como próxima tarea en abril se planifica realizar el sector B del 4to piso y comenzar las tareas en el subsuelo con la construcción de los drenes que estarán bajo piso y pozos de bombeo. Además debemos realizar la iluminación del subsuelo para poder trabajar, ya que es un sector donde no llega la luz natural suficiente para trabajar.

Como resumen podemos decir que la **estructura de hormigón** armado del edificio se encuentra ejecutada en un **75%**.

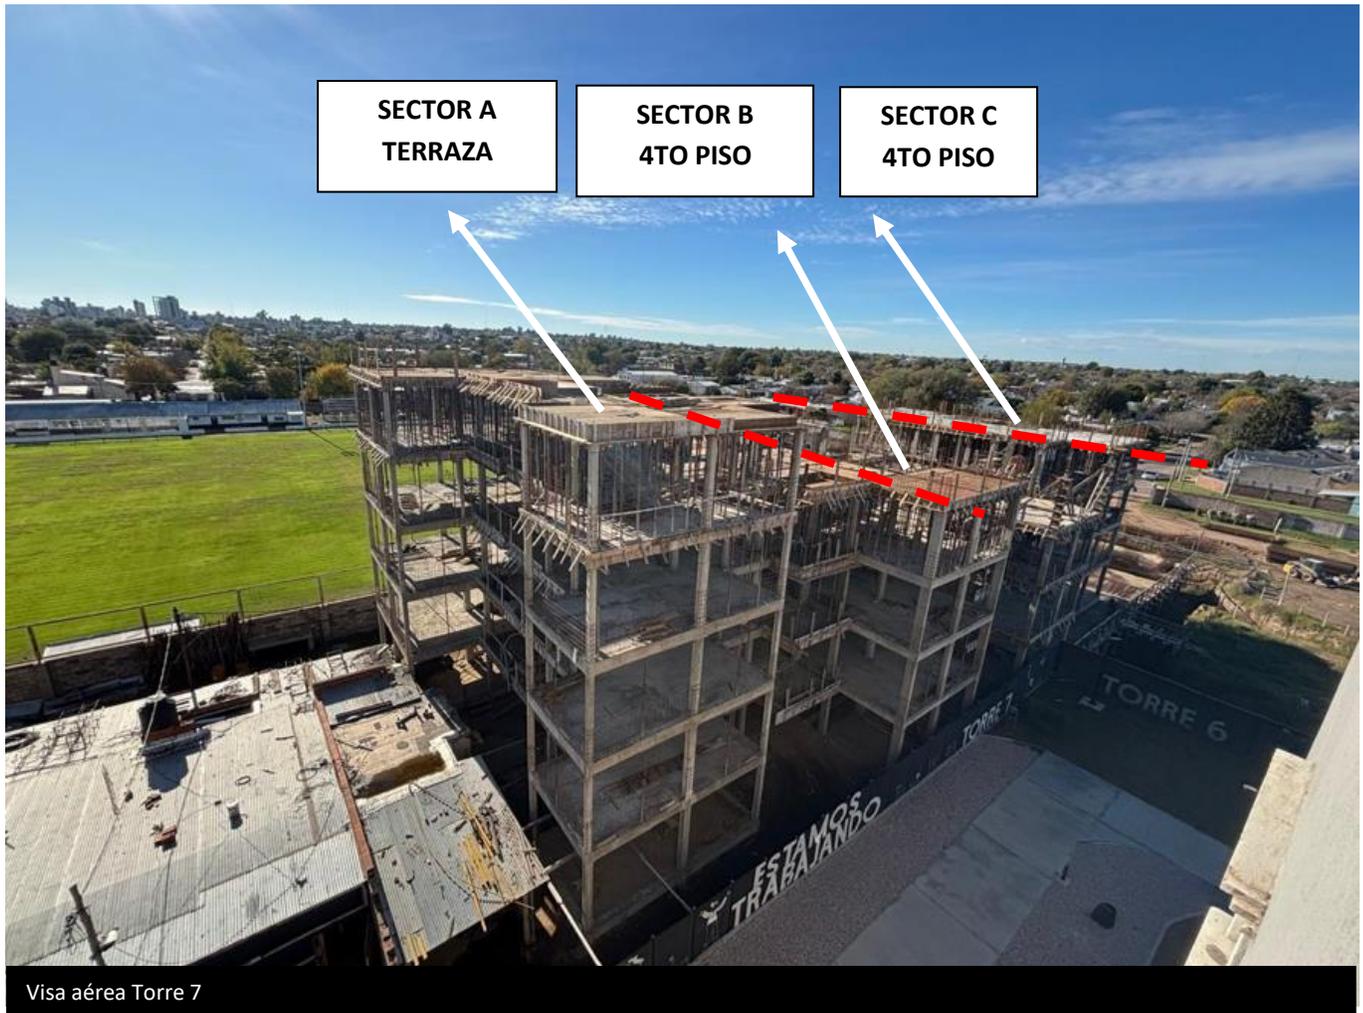

Visa aérea Torre 7




Además, queríamos informar que diariamente se realiza limpieza de obra para evitar que queden elementos peligrosos que pueden producir accidentes. Por otro lado, se realizan limpiezas periódicas en baños, comedor y obradores y service de palita mini cargadora.



Vista. LOSA SECTOR B – 3ER PISO y 4to PISO SECTOR C.

El equipo de trabajo de obra cuenta con 26 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizó compra de hormigón H21 a la empresa TOSCA SUR, con respecto a otros materiales como madera y hierro **compramos según la demanda que tengamos en obra.**

Es un momento clave de la obra para poder avanzar con varios frentes de trabajo, es imprescindible la inversión de dinero para acopio de materiales y adelantar en tiempo de construcción.

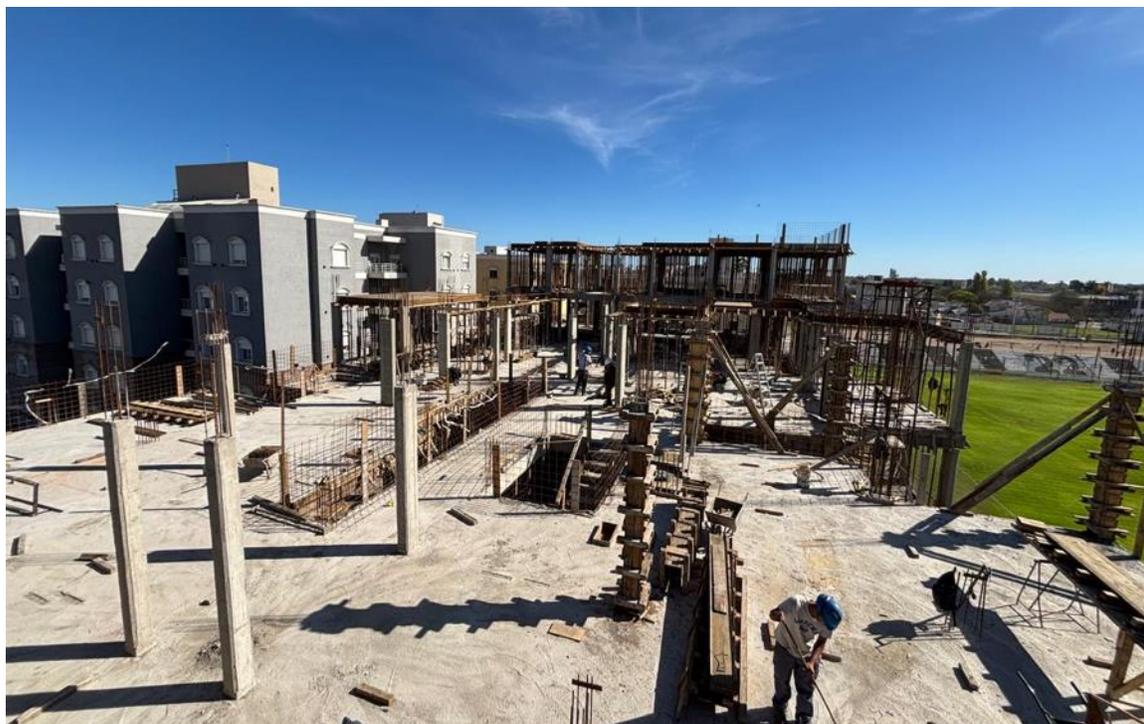

Vista. LOSA SECTOR B – 3ER PISO y LOSA SECTOR A Terraza

